

Inpassing nieuw Akkerbouw Erf
Broekstukkenweg Zweeloo

Toekomstige nieuwbouw

Bestaande gebouwen

Erf verharding

Bestaande bomen/groen

Te planten bomen

Te planten hagen

Te planten bosplantsoen

Overige beplanting

Bestaande watergangen

Nieuwe waterberging (wadi's)



170m Te planten gemengde Hagen 850 st

lat. naam	ned. naam	aant.	Maat
viburnum opulus	gelderse roos	165	100/120cm
Crateagus monogyna	Meidoorn	340	100/120cm
Ligustrum vulgare	huist	165	100/120cm
Ilex aquifolium	hondsroos	65	100/120cm
Rosa Canina		115	100/120cm

Definitieve plaats bepalen in het werk;
- plantlocatie goed losmaken en voorzien van GFT compost
- 5st. per meter aanplanten
- voorzien van haagmeststof (Ecostyle /bionova /dcm)

AANLEG BOSPLANTSOEN
terrein spitten met spitmachine, daar planten volgens schema/lijst. plantafstand 1x 1,5m in wildverband (Met spitten rekening houden met aanwezige bomen/struiken)

ONDERHOUD BOSPLANTSOEN
1e jaar onkruid bestrijding, vrijhouden beplanting dmv maaien of schoffelen.
na 1 jaar inboeten
in het 3e/4e jaar na aanplant 1e gefaseerde dunning, zgn wijkers en blijvers,
het eindresultaat is een dichte singel met enkele uitgegroeide bomen met daaronder een gevarieerde onderbeplanting die gefaseerd word afgezet (eens in de 6 jaar)

900 st te planten bosplantsoen 100/120cm

lat. naam	ned. naam	aant.	waar geplant
Alnus glutinosa	Zwarte els	50	door gehele aanplant
Prunus spinosa	Sleedoorn	150	in groepen aan randen
Sambucus nigra	Gewone vlier	100	in groepen aan randen
Ilex aquifolium	Kruip wilg	75	in groepen aan randen
Salix cinerea	Grauwe wilg	75	door gehele aanplant
Crateagus monogyna	Meidoorn	100	in groepen aan randen
Rhamnus frangula	Vuilboom	50	in groepen aan randen
Viburnum opulus	Gelderse roos	100	door gehele aanplant
Quercus robur	Zomereik	50	door gehele aanplant
Betula pendula	Berk	50	door gehele aanplant
Amelanchier lamarkii	Krent	50	door gehele aanplant
Corylus avellana	Hazelaar	50	door gehele aanplant


AAN PLANT BOMEN
Plantgaten 1x1m losmaken voorzien van 0,1m3 GFTcompost en 1 liter haagmeststof (Ecostyle/bionova/dcm) voorzien van 2 onbehandelde boompalen en drainage/luht/watergeef slang

ONDERHOUD BOMEN
1e jaar evt. watergeven in droge periodes, tevens schoonhouden boomsplegel in het 3e/4e jaar na aanplant 1e vormsnoei en controle boombanden.

Te planten Bomen

lat. naam		aant.	Maat
Aesculus carnea Briotii	Rode Paardenkastanje	1	14/16
Tilia europaea	Hollandse Linde	2	18/20
Quercus robur	Zomereiken	4	14/16
Juglans regia	Walnoot	2	14/16
Hoogstam Fruitbomen soorten	n.t.b	10	12/14
Betula pendula	Berk	4	verent
Fagus sylvatica Atropurpureum	Rode beuk	1	18/20

Definitieve plaats bepalen in het werk;
- bomen moeten een goede toekomst tegemoet gaan
- dus op voldoende afstand onderling en met aanwezige bomen
- de bomen moeten zich kunnen ontwikkelen tot volwassen bomen.
- hij moet "gedragen" worden door de bewoners (een boom die in de "weg" staat heeft op een boeren erf geen toekomst!)

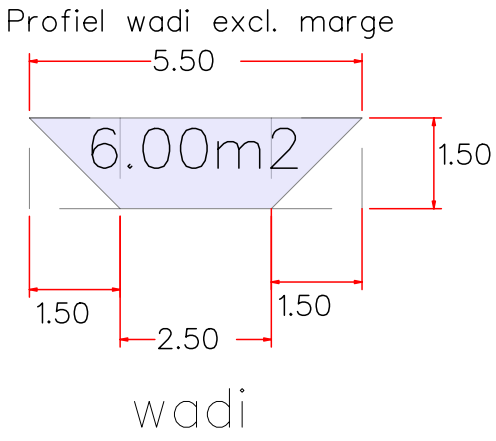

Reuvers Buro voor Groene Ruimtes

Aelderstraat 70
7854 RS Aalden

Aelderstraat 70
7854 RS Aalden
Tel. (0591) 372328

www.burovoorgroeneruimtes.nl
www.wilfriedreuvers.nl
info@wilfriedreuvers.nl

Werk
Fam Lubbers Zweeloo

Onderwerp
Erfinrichtingsplan
Broekstukkenweg Zweeloo

Datum 25-09-2025	Schaal A1 1:500	Getek.
----------------------------	---------------------------	---------------
