

**Rapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering
conform NEN2990:2012.**Pagina 1 van 5
22 maart 2021Projectnummer PLM Lab
Projectnummer opdrachtgever1816238
A21039 Julianalaan 14 Montfoort**Opdrachtgever**J.A. Goris & Zonen B.V.
van der Schuerenweg 8
6686 BA Doornenburg**Locatiegegevens**

Adres van onderzoek	Julianastraat 14 te Montfoort
Omschrijving locatie	Kantoorruimte in een gemealgebouw
Accreditatie	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.
Inventarisatierapport	08012101 HO versie 1 (trifium)
Type werk of sanering	Containment
	Risicoklasse=2

Inspectiegegevens

Datum controle	19 maart 2021
Aankomsttijd inspecteur	09:00
Vertrektijd inspecteur	12:00

Onderdelen	Omvang	Resultaat
Visuele inspectie	14 m2	Voldoet.
Luchtmeting fasecontrast	2 stuks	Voldoet.
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Conclusie

Op basis van de eindbeoordeling is geconcludeerd dat de onderzochte locatie voldoet aan de eisen die zijn gesteld in NEN2990:2012. De locatie is vrijgegeven.

DTA op locatie

Dhr. T. Houterman

Inspecteur

Ronald de Ruijter



Het onderzoek is onder de accreditatie van PLM Laboratorium uitgevoerd (I287). Eventueel bijgevoegde SEM-resultaten zijn onder de accreditatie van Stella Analyse B.V. uitgevoerd.

Deze rapportage bestaat uit diverse onderdelen die samen een onderbouwing vormen van de weergegeven conclusie of de betreffende werkplaats na asbestverwijdering voldoet aan de gestelde eisen. Als er onderdelen ontbreken of het resultaat is 'niet klaar', dan kan nog geen conclusie worden getrokken. De rapportage mag op geen enkele wijze worden aangepast of worden gereproduceerd, tenzij volledig, zonder schriftelijke toestemming van PLM laboratorium Services BV. Een duplicaat van de op locatie afgegeven definitieve rapportage zal worden toegestuurd. Als er wijzigingen aan de rapportage zijn aangebracht door PLM, is dit kenbaar gemaakt. De gewijzigde versie vervangt het eerder afgegeven certificaat. Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van PLM Laboratorium Services BV van toepassing. Kenmerk: F701 Rapportagesjabloon versie 12-10-2020.

**Rapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering
conform NEN2990:2012.**

Pagina 2 van 5
22 maart 2021

Projectnummer PLM Lab 1816238
Projectnummer opdrachtgever A21039 Julianalaan 14 Montfoort

Inspectieresultaten bronnen inventarisatierapport

Broncode	Omschrijving	Resultaat
Bron 1	Vinyltegels met lijnlaag, 13 m ² , chrysotiel, 2-5%, Hechtgebonden, Bron volledig weg.	Voldoet.
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

Inspectieresultaten aangetroffen objecten e.d.:

Omschrijving	Aanwezig	Segment(en)	Waarneming	Conclusie
Constructiedelen	Ja	1	Schoon	Akkoord
Kabelgoten en doorvoeren	Nee	-	-	-
Ventilatiekanalen	Nee	-	-	-
Buizen	Ja	1	Schoon	Akkoord
Verwarmingselementen	Nee	-	-	-
Kozijnen	Ja	1	Schoon	Akkoord
Plinten	Nee	-	-	-
Vloer	Ja	1	Schoon	Akkoord
Steigers, trappen, gereedschappen	Ja	1	Trap / schoon	Akkoord
Deco, transitsluis- en routes	Ja	1	Drietrapssluis / schoon	Akkoord
Installaties	Nee	-	-	-

Werkgebied stofvrij	Ja
Uitsluitingen	Achter/onder/boven afplakkingen.
Beperkt geïnspecteerd (<100%)	In naden en kieren.
Opmerkingen	Deur is afgeplakt met tape.

Deelconclusie visuele inspectie

De betreffende locatie voldoet aan de eisen ten aanzien van de visuele inspectie. De visuele inspectie is een momentopname en beperkt tot waarneembare delen en waarneembaar asbest.

**Rapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering
conform NEN2990:2012.**

Projectnummer PLM Lab 1816238
Projectnummer opdrachtgever A21039 Julianalaan 14 Montfoort

Pagina 3 van 5
22 maart 2021

Details van de luchtmetingen

Nr.	Begindebiet in liters/min	Einddebiet in liters/min	Meetduur in minuten	Volume in liters	Filter homogeen	Overbeladen	Velden in stuks	Vezels in stuks
FC01	8,4	8,3	120	998	Ja	Nee	100	1
FC02	8,4	8,4	120	1005	Ja	Nee	100	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resultaat luchtmetingen

Nr.	Omschrijving monster	Ruimte nummer	Concentratie vezels/m3			Toets
			Nominaal	Ondergrens	Bovengrens	
FC01	Voor in het containment.	1	530	10	2.950	<10.000
FC02	Achter in het containment.	1	530	10	2.930	<10.000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Gebruikte middelen
Microscop Nikon Eclipse Ci-S Resolutietest Mark II Blok 5 Gemengde cellulose-esterfilter Luchtpomp Airwibe XTR Rotameter Brooks Sho-rate

Geo- metrische gemiddelde	Nominaal	Ondergrens	Bovengrens	Toets
Ruimte 1	530	60	1.910	<10.000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Deelconclusie luchtmeting fasecontrast


De berekende geometrisch gemiddelde concentraties in de gemeten ruimten zijn, getoetst aan de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval, NIET hoger dan de toetswaarde van 10.000 vezels/m3. Conform het Arbobesluit artikel 4.51a-lid 2 is hiermee wel voldaan aan de eisen, ten aanzien van de analyse van lucht met fasecontrastmicroscopie. De ruimten zijn wel vrijgegeven.

**Rapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering
conform NEN2990:2012.**

Pagina 4 van 5
22 maart 2021

Projectnummer 1816238
Projectnummer opdrachtgever A21039 Julianalaan 14 Montfoort

Adres locatie Julianastraat 14 te Montfoort
Omschrijving Kantoorruimte in een gemealgebouw
Oppervlak werkgebied/Containment 14 m²
Aantal segmenten 1 segmenten
Volume containment 33 m³

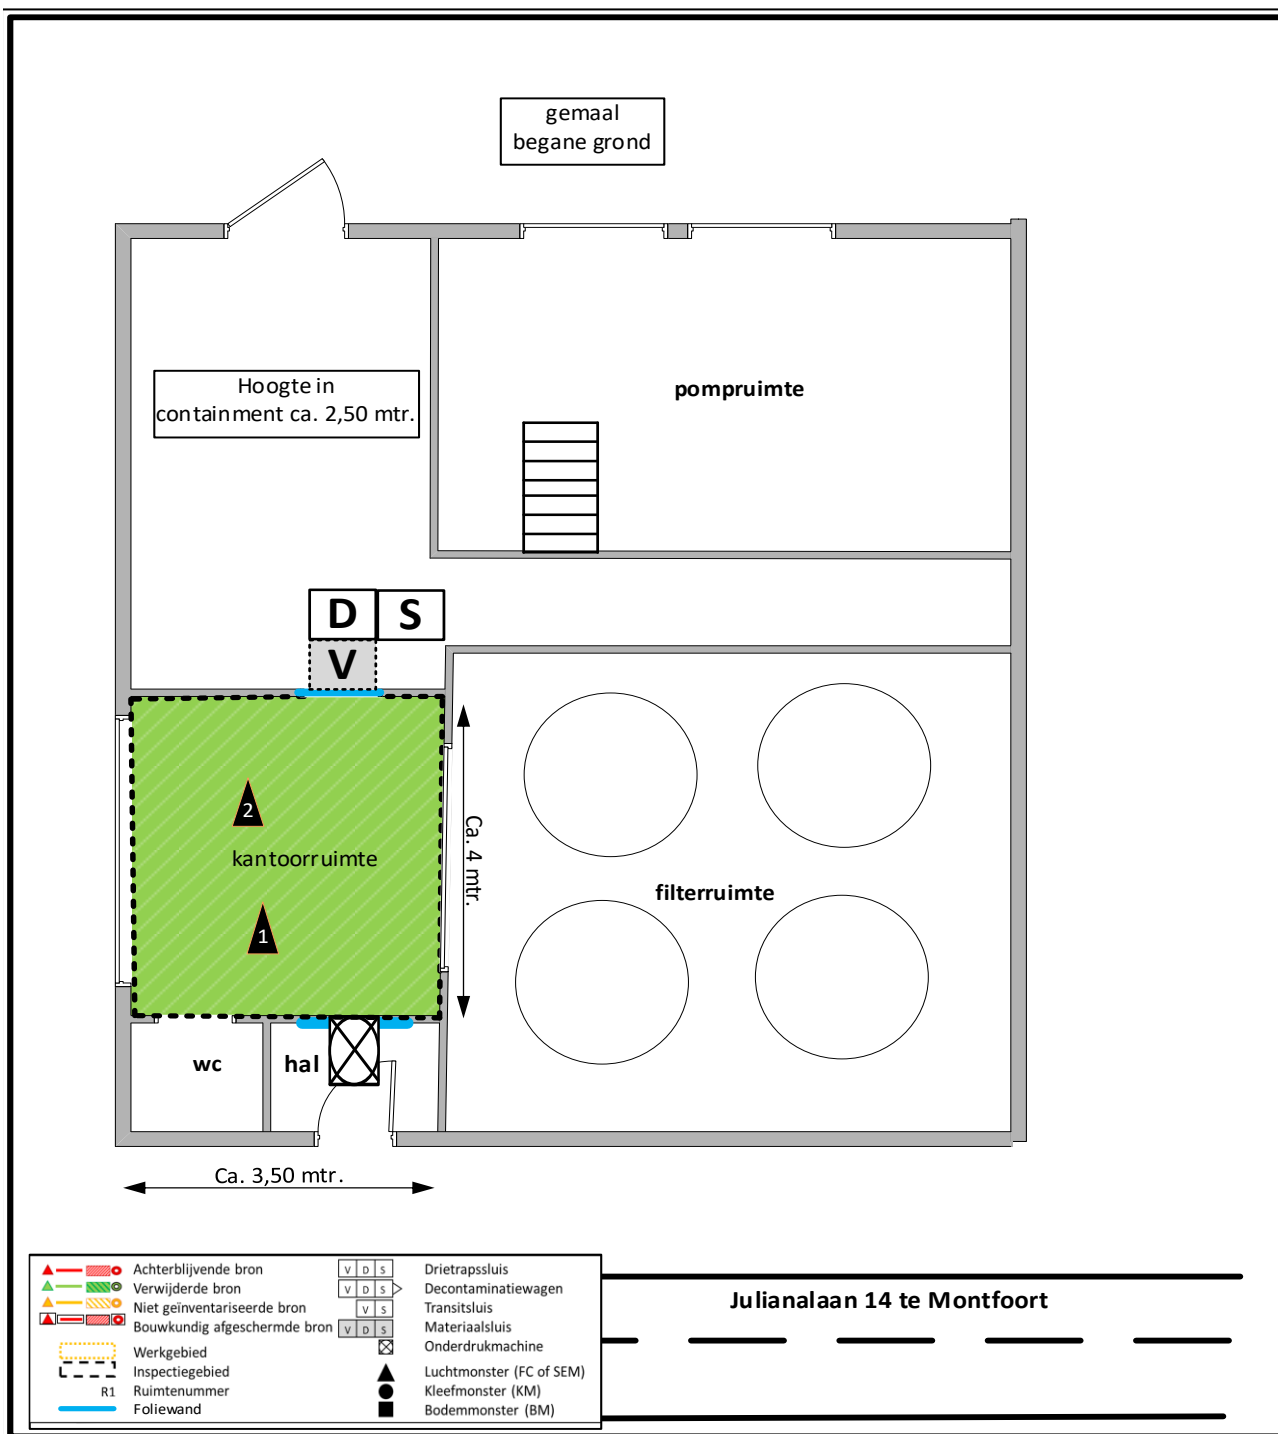

**Rapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering
conform NEN2990:2012.**

Pagina 5 van 5
22 maart 2021

Projectnummer PLM Lab
Projectnummer opdrachtgever

1816238
A21039 Julianalaan 14 Montfoort



Foto 1: Vooraanzicht gemaal.



Foto 2: Entree gemaal.



Foto 3: Opstelling drietrappsluis.



Foto 4: Opstelling FC01 en FC02 op locatie verwijderde bron.



Foto 5: Aanzicht odm in foliewand.



Foto 6: Close up verwijderde bron.
